


श्री सुजीत कुमार, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 21-01-2015 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मक्खनपुर हाथवन्त से प्रतापपुर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण की टिप्पणी:

दिनांक 21-01-2015 को अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई कार्यालय कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माणाधीन मक्खनपुर हाथवन्त से प्रतापपुर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री गौतम सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, श्री मंजीत सिंह, अवर अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० एवं श्री आर०के० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण साथ में उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण में पायी गई स्थिति का विवरण निम्नवत् है:-  
मक्खनपुर हाथवन्त से प्रतापपुर मार्ग:

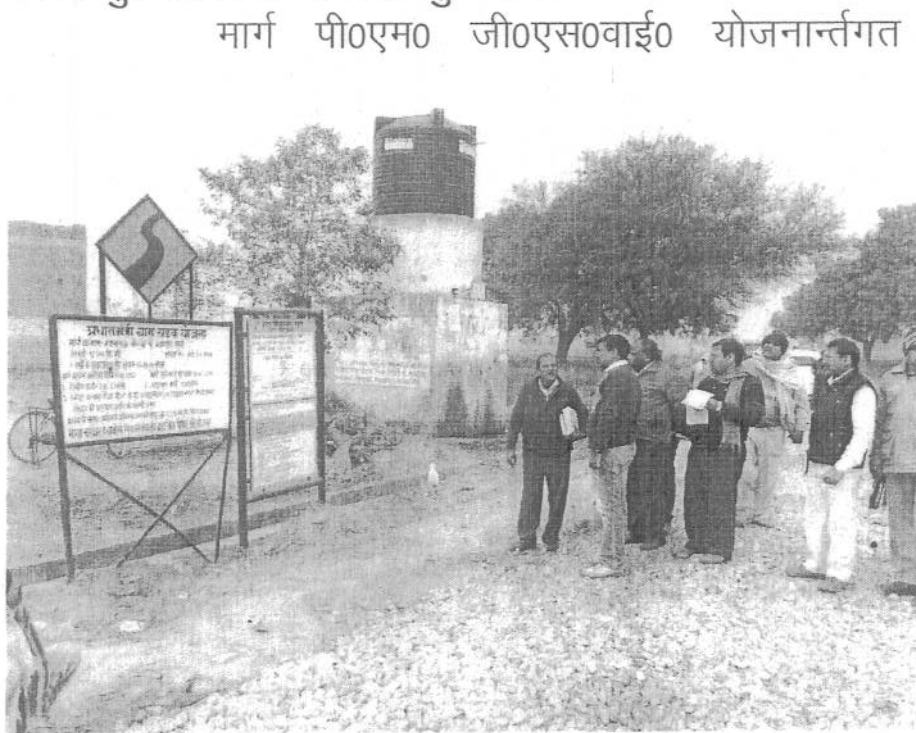

मार्ग पी०एम० जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत मक्खनपुर चौराह से हाथवन्त प्रतापपुर तक निर्माणाधीन है। उपस्थित सहायक अभियन्ता श्री गौतम ने अवगत कराया यह मार्ग पूर्व में 3 मीटर चौड़ा डबलर युक्त पूर्व से निर्मित था। यह सड़क खराब हो गयी थी। मार्ग के दौनों ओर 105(52.50+52.50)से०मी० चौडीकरण कार्य के साथ मार्ग सुदृढीकरण कार्य

किया जा रहा है। चौडीकरण (widening) के भाग में 15 से०मी० मोटाई में जी.एस०बी०, 7.50से०मी० मोटाई में, जी-2 एवं पूरी चौडाई में 7.5से०मी० मोटाई में, जी-3 तथा 20एम.एम.पी.सी. किए जाने का प्राविधान किया गया है। सड़क की पूरी लम्बाई 12 कि०मी० निर्धारित है। इस कार्य की परियोजना लागत रु०386.53 लाख की धनराशि स्वीकृत हैं। सड़क पर 4 पुलिया एवं 5 कलवर्ट गूल का भी प्राविधान है।


स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि सड़क पर मक्खनपुर चौराह से लगभग 100 मीटर में, खैरगढ आवादी क्षेत्र के लगभग 500 मीटर (चैनेज 7.250 से 7.750 तक) में अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। उपस्थित अभियन्ता/अवर अभियन्ता ने बताया कि यह आवादी क्षेत्र है और छोटे हुए भाग में इन्टरलॉकिंग का कार्य कराया जायेगा। निरीक्षण के समय मक्खनपुर से विल्टीगढ नदी पुल के पार तक लगभग 2 कि०मी० की दूरी में गिट्टी विछाये जाने का कार्य चल रहा था। इस दूरी के बाद खैरगढ आवादी क्षेत्र में 500 मीटर (चैनेज 7.250 से 7.750 तक) एवं पूर्व में ग्रा०अ०से० विभाग द्वारा सी०सी० कार्य निर्मित लगभग 150 मीटर (चैनेज 7.750 से 7.900 तक) दूरी को छोड़कर प्रतापपुर चौराह (अंतिम बिन्दु) तक सड़क पर पी०सी० कार्य किया जा चुका है। इस छोटे हुए चैनेज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि केवल रिपैरिंग कार्य किया जायेगा। खैरगढ में सड़क का प्रारम्भ से अन्त तक निरीक्षण किया गया। पी०सी० कार्य 7 स्थानों पर उखड़ गया है। उपस्थित सहायक अभियन्ता /अवर अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई को निर्देशित किया गया है कि इन स्थानों पर सड़क तत्काल ठीक कराये। सड़क पर पटरी कार्य नहीं हुआ है। मार्ग की सतह में Undulations है। समग्र रूप से पूरे कार्य की गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है।



दो स्थानों एक हाथवन्त प्राथमिक विद्यालय के पास एवं एक खैरगढ – प्रतापुर के बीच सड़क खुदवाकर मोटाई चैक की गयी तथा चौड़ाई का मापांकन कराया गया। मोटाई तथा चौड़ाई निर्धारित विल के अनुरूप पायी गयी। सम्बन्धित ठेकेदार भी मौके पर उपस्थित हुए। अभियन्ता व ठेकेदार को निर्देशित किया गया गया है कि पेंटिंग कार्य में उक्त अंकित कमियां तत्काल ठीक कराये तथा अवशेष भाग का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाये। सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0 शिकोहाबाद को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वह कार्य दौरान कार्य स्थल पर उपस्थित रहें। अधिशासी अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शिकोहाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण करते हुए पायी गई कमियों को ठीक कराते हुए निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0)

  
(सुजीत कुमार),  
मुख्य विकास अधिकारी  
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 378 / एस0टी0


दिनांक 23/01/15

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1—आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।

2—जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।

3—अधिशासी अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, को अनुपालनार्थ।

  
मुख्य विकास अधिकारी  
फिरोजाबाद।
