
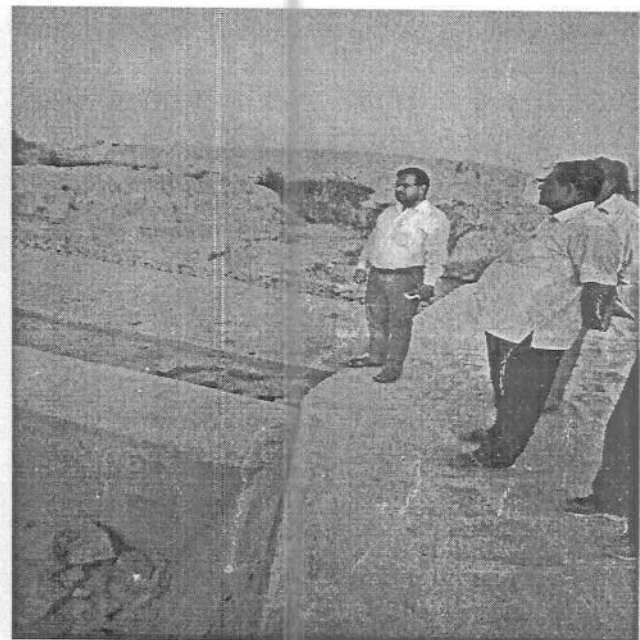


श्री कर्मेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 20-05-2016 को चैक डैम निर्माण कार्य के आकस्मिक निरीक्षण की टिप्पणी :

दिनांक 20-05-2016 को लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे चैक डैम के निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन के समय श्री कमलेश कुमार, सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई), श्री एम0पी0 सिंह, अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई), श्री आर0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उपस्थित रहे। निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन में स्थिति निम्नवत् पायी गयी।

1-नगला बली में सिरसा नदी पर चैक डैम निर्माण कार्य :

प्रस्तुत प्राकलन के अनुसार इस चैक डैम निर्माण की कुल

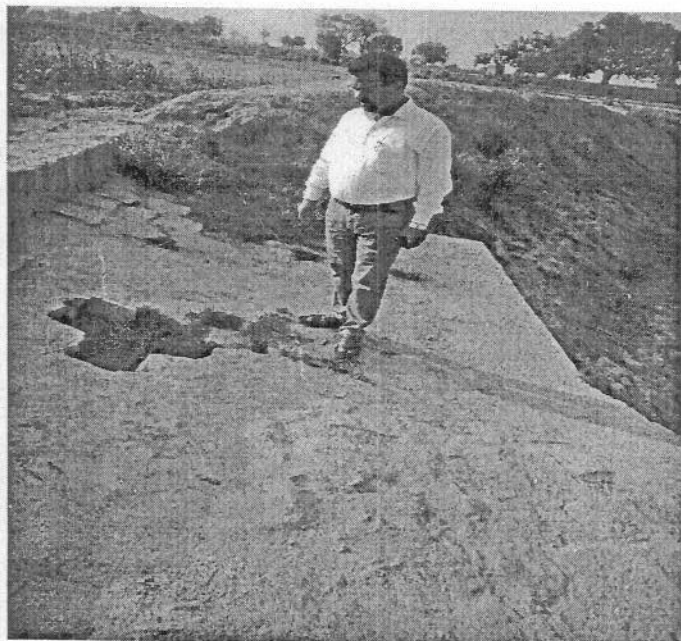

लागत रू0 23.08 लाख है। इसमें नाला/नदी विकसन कार्य हेतु रू0 3.80 लाख मनरेगा से डब्ले किया गया है। सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) ने बताया कि पक्का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर रू0 17.71 लाख व्यय किया जा चुका है। स्थल पर पक्के कार्य में साइड पिचिंग के पत्थर धंस गये हैं। एक थान पर पत्थर अधिक धंस जाने के कारण गड्ढा हो गया है। बताया गया कि पक्के कार्य के दोनों तरफ 300-300 मीटर कुल 600 मीटर की दूरी में मनरेगा की धनराशि से मिट्टी कार्य, नदी/नाला विकसन कार्य किया जाना था, परन्तु स्थलीय निरीक्षण में लगभग 200 मीटर दूरी में होना पाया गया। मनरेगा का शेष कार्य अवशेष है। उपस्थित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता, (लघु सिंचाई) को निर्देशित किया गया है कि खराब हुई साइड पिचिंग तत्काल ठीक कराते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि मनरेगा मद से होने वाला अवशेष मिट्टी कार्य प्रत्येक दशा में वर्षात प्रारम्भ होने से पूर्व ही पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई)

2-ग्राम नगला धनपाल के पास झरना नाले पर चैक डैम निर्माण कार्य :

प्रस्तुत प्राकलन के अनुसार इस कार्य की स्वीकृत लागत रू0 23.12 लाख है। जिसमें मनरेगा से नाला/नदी विकसन कार्य हेतु रू0 3.87 लाख डब्ले ल किया गया है। सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई ने बताया कि पक्का निर्माण कार्य लगभग



पूर्ण हो चुका है। मौके पर पक्का कार्य लगभग ठीक परिलक्षित हुआ, परन्तु मनरेगा का कोई कार्य नहीं कराया गया है। उपस्थित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) को निर्देशित किया गया है कि मनरेगा कार्य के साथ-साथ चैक डैम का सम्पूर्ण कार्य प्रत्येक दशा में वर्षात प्रारम्भ होने से पूर्व ही पूर्ण करा लिया जाय।

(कर्मन्द्द्र सिंह)

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक 50 / एस0टी0-मु0वि0अ0

दिनांक 23-05-16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-जिलाधिकारी फिरोजाबाद को कृपया अवलोकनार्थ।
- 2-परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद।
- 3-अधिशायी अभियन्ता, लघु सिंचाई, फिरोजाबाद।
- 4-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, फिरोजाबाद।
- 5-जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, फिरोजाबाद।

20.5.16
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।
