


श्री सुजीत कुमार आई० ए० एस०, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 13-01-2015 को, आई० टी० आई० शिकोहाबाद/आई०टी०आई० नवीन भवन निर्माण में किये गये निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन की टिप्पणी।

### 1- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिकोहाबाद।

#### क. उपस्थिति:-

पूर्वाहन 12:30 बजे आई०टी०आई० शिकोहाबाद पहुंचने पर प्रिंसिपल श्री ओमकार सिंह स्टाफ सहित उपस्थित मिले। उपस्थिति का निरीक्षण करने पर श्री विजय कुमार गुप्ता अनुदेशक की अनाधिकृत उपस्थिति पाये गये। श्री गुप्ता, अनुदेशक का दिनांक 13-01-2014 का वेतन काटने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिये गये है। आई०टी०आई० का अन्य स्टाफ उपस्थित मिला। प्रधानाचार्य ने अवगत कराया कि वर्तमान में केवल तीन अनुदेशक कार्यरत है।

**ख- भवन एवं पहुंच मार्ग:-** वर्तमान में आई०टी०आई० किराये के भवन में संचालित है। भवन के शिक्षण कक्षों में प्लास्टर नहीं है तथा व्यवस्थित ढंग से संचालन का अभाव है। जगह जगह मकड़ी का जाला एवं विद्युत के तार लटक रहे हैं। संस्थान तक एप्रोच रोड भी ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया है तथा कार्यालय व शिक्षण कक्ष में गन्दगी व्याप्त है। जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा 28-10-2014 को इस आई० टी०आई० का निरीक्षण किया गया था। तत्समय सफाई अभियान चलाने, छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने, लाइब्रेरी में पुस्तक/पोस्टर आदिक्रय कर छात्रों का ज्ञानवर्धन कराने, संस्थान तक पहुंचने वाली गली में इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण अधिशासी अधिकारी नगर पालिका शिकोहाबाद के माध्यम से कराने एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग के माध्यम से ट्रेड में प्रशिक्षण पूरा करने

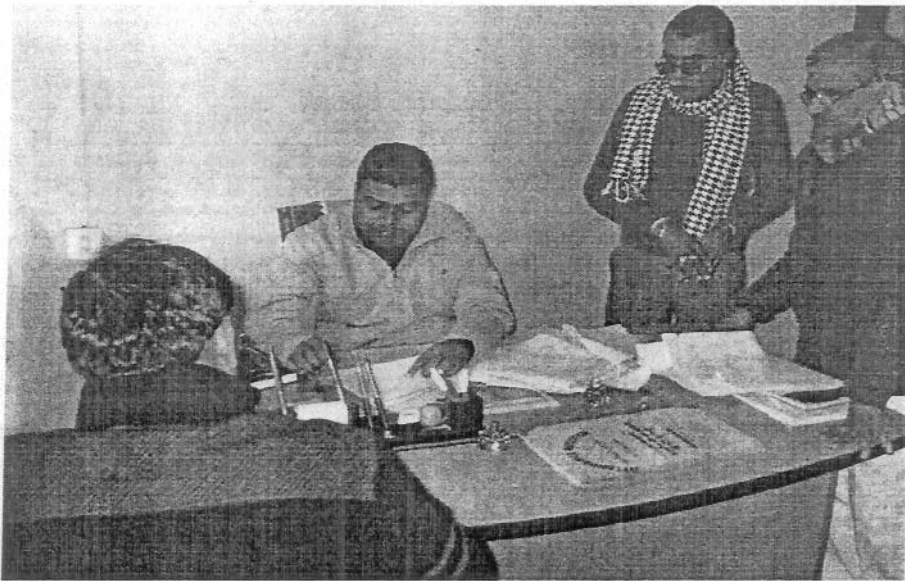

वाले छात्रों का सेवायोजन/धन्धा-रोजगार खोलने में सहायता पहुंचाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु किसी भी स्तर से निर्देशों का किसी बिन्दु पर समुचित अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं हुआ। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

मौजूदा प्रधानाचार्य को तत्काल निर्देशित अधिकारियों से सम्पर्क कर अनुपालन कराने के

निर्देश दिये गये है। प्रधानाचार्य का कहना था कि उन्होंने अभी हाल ही में योगदान किया है। अब वह शीघ्र अनुपालन करायेंगे। प्रधानाचार्य ने अवगत कराया कि वह इन्टरलॉकिंग कार्य के लिए अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शिकोहाबाद को पत्रांक 1582 दिनांक 10-11-2014 द्वारा एवं पत्रांक 1489 दिनांक 31-10-2014 द्वारा अनुरोध कर चुके है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद को चेतावनी निर्गत की जाती है कि वह तत्काल संस्थान तक पहुंचने वाली गली का निरीक्षण कर इन्टरलॉकिंग कर गली का निर्माण करायें तथा अनुपालन आख्या एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

(कार्य0- प्रधानाचार्य औ0 प्रशि0 संस्थान/अधि0 अधि0 न0पालिका परि0 शिको0)

ग- पठन पाठन :

प्रधानाचार्य ने अवगत कराया कि अखिल भारतीय व्यवसायिक पूरक परीक्षा जनवरी 2015 संस्थान में हो रही है। जिसके कारण संस्थान के अन्य छात्रों की छुट्टी कर दी गयी है। फलस्वरूप ट्रेडवार छात्रों की उपस्थिति का निरीक्षण नहीं हो सका। प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में ट्रेडवार छात्र नामांकन निम्नवत् है:-

क्र०सं०	ट्रेड/व्यवसाय का नाम	प्रथम वर्ष में छात्र पंजीकरण	द्वितीय वर्ष में छात्र पंजीकरण	योग
1	इलैक्ट्रीशियन	19	34	53
2	वायरमैन	21	34	55
3	इलैक्ट्रॉनिक्स	21	20	41
4	श्रे०/टी०वी०	13	—	13
कुल योग		74	88	162

प्रधानाचार्य को प्रत्येक ट्रेड में निर्धारित छात्र संख्या के अनुसार नियमों के अन्तर्गत प्रवेश अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों के दाखिले किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



जिलाधिकारी  
महोदय फिरोजाबाद  
द्वारा संस्थान के डाटा  
की आधारभूत बुकलेट  
रखने एवं छात्रों की  
शिक्षा पूरी होने पर उन्हें  
सेवायोजन/धन्धा  
रोजगार खोलने में  
महाप्रबन्धक जिला  
उद्योगकेन्द्र से

स्वरोजगार हेतु चयनित कराये जाने सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन प्रधानाचार्य द्वारा किया जाना परिलक्षित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य को सचेत किया गया है कि अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही- प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिको0)

घ- लाइब्रेरी:

जिलाधिकारी महोदय के निरीक्षण के समय कार्यालय व्यय में रूपया 15000.00 की उपलब्धता में से मात्र 2000.00 रूपया व्यय करने एवं लेखन सामग्री मद में रूपया 6000.00 की धन राशि में से व्यय रूपया 1250.00 की स्थिति यथावत पायी गयी। पुस्तक/पोस्टर आदि क्रय किये जाने के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। प्रधानाचार्य ने बताया कि अनुदेशकों से मांग पत्र प्राप्त कर लिये गये है। शीघ्र ही आवश्यक पुस्तकें क्रय कर ली जायेगी। निर्देशित किया गया कि 15 दिन में हर हालत में आवश्यक पुस्तकें कार्यालय मद से नियमानुसार क्रय कर ली जायें।

(कार्यवाही- प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिको0)

प्रधानाचार्य ने एक पत्रावली प्रस्तुत करते हुए संस्थान द्वारा निर्गत पत्रांक 1580 दिनांक 10-11-2014 प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार जिलाधिकारी महोदय के निरीक्षण दिनांक 28-10-2014 की अनुपालन आख्या भेजी गयी है। अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया परन्तु निरीक्षण के दौरान विधित हुआ कि वास्तविक स्थिति में स्थल पर अनुपालन अभी अपेक्षित है। प्रधानाचार्य ने आश्वासन दिया है कि वह अतिशीघ्र निर्देशित कार्य पूर्ण करा लेंगे। जिला अर्थ एवं सख्या अधिकारी सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षणों की अनुपालन आख्यायें अपलोड अवश्य करा दी जायें।

(कार्यवाही- जिला अर्थ एवं सख्या अधिकारी)

2- आई0 टी0आई0 का नवीन भवन निर्माण कार्य:

आई0टी0आई0 का निर्माणाधीन भवन, ग्राम पंचायत मेहराबाद में बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 आगरा इकाई द्वारा निर्माण कराया जा रहा। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सी0बी0 शर्मा ने बताया कि रूपया 358.96 लाख है जिसके सापेक्ष रूपया 251 लाख उन्हें प्राप्त हुआ और व्यय रूपया 220.58 लाख है। मौके पर कार्य लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण है। भूतल के आठ कमरे का लेंटर पड चुका है। बाउन्ड्री वाल के पिलर लगे है परन्तु पिलरों के मध्य ईट वर्क नहीं हुआ है। निरीक्षण के दौरान 25 श्रमिक कार्य पर लगे हुए थे तथा और मौके पर कार्य हो रहा था। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि प्राजेक्ट का संसोधित प्रांकलन रूपया 556 लाख का निदेशालय को प्रेषित किया गया है। यदि अवशेष धन राशि प्राप्त हो जाती है तो भवन का निर्माण कार्य जून 2015 तक पूर्ण कर देंगे। निर्देशित किया गया कि अधिकाधिक मजदूर व मिस्त्री लगायें ताकि कार्य द्रुतगति से हो

सके साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कार्यदायी संस्था के अभियन्ता की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- परियोजना प्रबंधक यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 आगरा इकाई)।

(सुजीत कुमार),  
मुख्य विकास अधिकारी,  
फिरोजाबाद।


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 361 /एस0टी0/निरीक्षण/2014-15

दिनांक 14-1-2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 2- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद।
- 3- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, फिरोजाबाद।
- 4- परियोजना प्रबंधक यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 आगरा इकाई।
- 5- प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिकोहाबाद को अनुपालनार्थ।

  
मुख्य विकास अधिकारी  
फिरोजाबाद
